


# 測定結果表

工事件名	〇〇公園施設整備工事	工種	〇〇盤基礎工	現場代理人	〇〇 〇〇
		測定場所	No. 〇	測定者	〇〇 〇
				立会人	〇〇 監督員

測定項目	設計値	測定値	偏差	規格値
基準高				±20
t1 基礎碎石厚	100	100	0	-20
t2 基礎コンクリート厚	500	500	0	
W1a 床付け幅	1,100	1,100	0	-20
W1b 床付け幅	700	700	0	-20
W2a 基礎コンクリート幅	1,000	1,000	0	-20
W2b 基礎コンクリート幅	570	570	0	-20

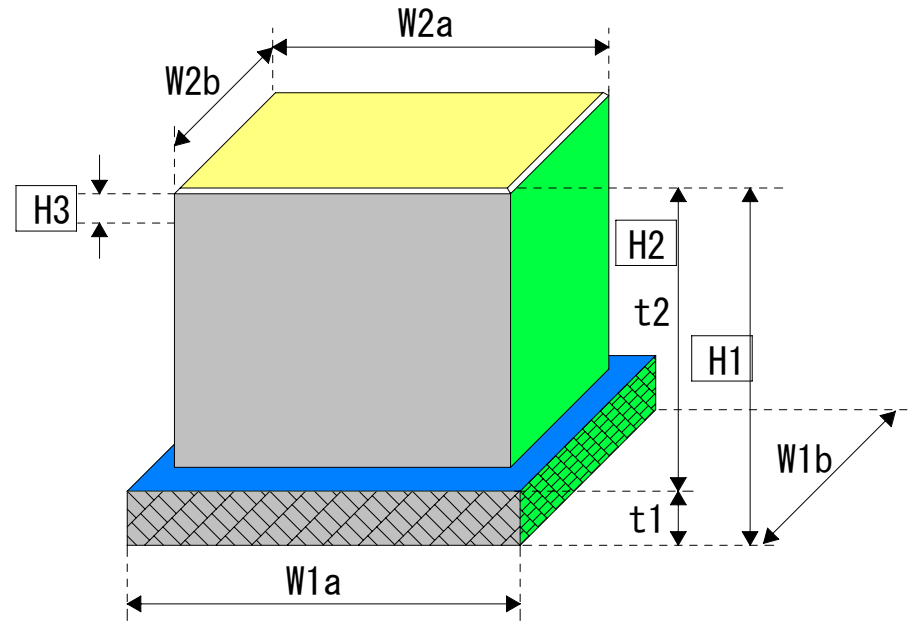

下り管理		設計値 (mm)	実測値 (mm)	測定厚 (mm)
H1	床付け検測	600	600	
H2	基礎碎石	500	500	t1 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">H1 - H2</span> 100
H3	基礎コンクリートブロック	100	100	
